


報告第7号

会館建設について

広島県薬剤師会館新築工事工程表

H29年 H30年

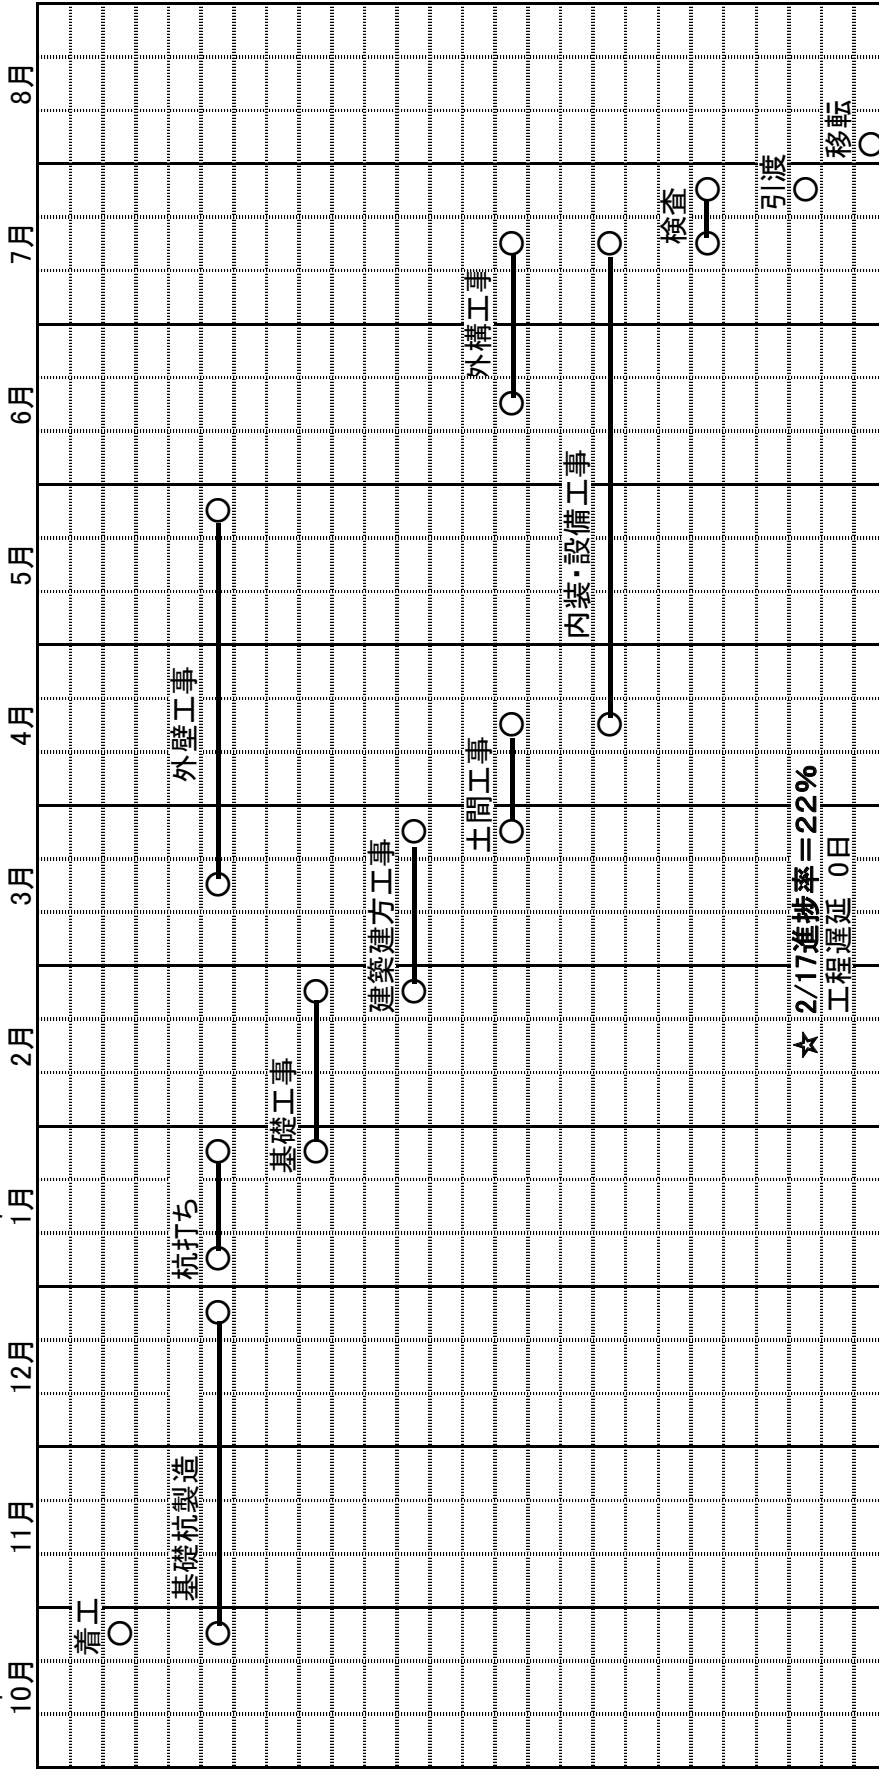

☆ 2/17進捗率=22%  
工程遅延 0日

15日  
建物位置  
立会

13日  
基礎コンク  
リート打設

3/31進捗  
45%予定

30日  
引渡し

平成 29 年 10 月 28 日（土） 安全祈願祭



平成 30 年 1 月 13 日（火） 基礎コンクリート打設

